

12-8

안양아트센터, 명학공원 일원 문화예술거리 조성

| 사업구분 | | | 이행구분 | | | | | | 이행률 | 완료시기 |
|-------------|-----|----|------|------|-----|------|---------|-------|-------|-----------|
| 성격 | 기간 | 재원 | 완료 | | 추진중 | | 미착수 | | | |
| | | | 종료 | 지속추진 | 정상 | 부진 | 검토중 | 시기미도래 | | |
| 신규 | 임기내 | 예산 | ○ | | | | | | 100% | 2023년 12월 |
| 중앙정부 도움 필요성 | | | 사업주체 | | | 추진부서 | 도시재생과장 | 주동완 | ☎5060 | |
| 해당없음 | | | 자체 | | | | 도시디자인팀장 | 양한규 | ☎5067 | |
| | | | | | | | 주무관 | 허진하 | ☎5080 | |
| | | | | | | | 주무관 | 신미현 | ☎5068 | |

□ 최종목표

안양8동 안양아트센터와 명학공원 일원의 넓은 공간을 활용하여 독창적인 야간 경관조명을 설치하고 거리환경을 개선하여 지역이 랜드마크로 조성하고 광장 내 휴게 벤치 등을 조성하여 시민을 위한 공간이 될 수 있도록 하기 위함

□ 연차별 목표

| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 사업 완료 | 사업검토 | 설계용역 | 착공 및 준공 | | |

□ 확인지표

- 안양아트센터, 명학공원 일원 문화예술거리 조성 사업 준공

□ 사업개요


- 사업명 : 안양아트센터, 명학공원 일원 문화예술거리 조성
- 사업위치 : 안양아트센터 ~ 명학공원 일원 (면적 31,500㎡)
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 12월
- 사업비 : 1,000백만원 (2021년도 하반기 특별교부세)
- 사업내용
 - ▶ 문화예술거리 조성, 진입부 등 주요 포인트 야간경관 연출
 - ▶ 안양아트센터 광장 내 쉼터 공간 조성, 게이트 및 현수막 게시대 설치 등
 - ▶ 안양아트센터 미디어아트 광장 조성

□ 연차별 · 분기별 로드맵

| 세부 추진계획 | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | | 입기후 |
|---------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-----|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 추진 계획수립 | | | | | | | | | | | |
| 설계용역 | | | | | | | | | | | |
| 착공 및 준공 | | | | | | | | | | | |

□ 추진실적

- 2021. 7. 30. : 사업 추진계획 보고
- 2021. 12. 3. : 2021년도 하반기 지역현안 특별교부세 교부결정
- 2022. 4. 28. : 2022년 제1회 추경예산 편성
- 2022. 5. 12. : 사업 추진협의체 사전회의
- 2022. 5. 16. : 디자인 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 7. 6. : 사업 추진협의체 보고회
- 2022. 9. 1. : 중간보고회
- 2022. 10. 11. : 주민설명회 (주민 21명, 시의원 2명 등 참석)
- 2022. 11. 4. : 안양시 공공디자인 진흥위원회 자문
- 2022. 11월 ~ 12월 : 자문의견 반영, 관계기관, 관련부서 업무협의
- 2023. 1. 5. : 사업 추진협의체 회의(주민 등 14명 참석)
- 2023. 1. 27. : 최종보고회
- 2023. 3. 13. : 디자인 및 실시설계 용역 완수
- 2023. 5. 10. : 미디어아트 영상콘텐츠개발 제작 설치 용역 착수
- 2023. 7. 3. : 시설물 및 전기공사 착공
- 2023. 8. 8. : 미디어아트 하드웨어 영상기기 설치 착수
- 2023. 9. 15. : 미디어아트 영상콘텐츠개발 제작 설치 용역 최종보고회
- 2023. 10. 6. : 미디어아트 하드웨어 영상기기 설치 완료
- 2023. 10. 14. : 명학음악회와 함께하는 미디어아트 축제 개최
- 2023. 12. 1. : 미디어아트 영상콘텐츠개발 제작 설치 용역 준공
- 2023. 12. 28. : 공사 준공

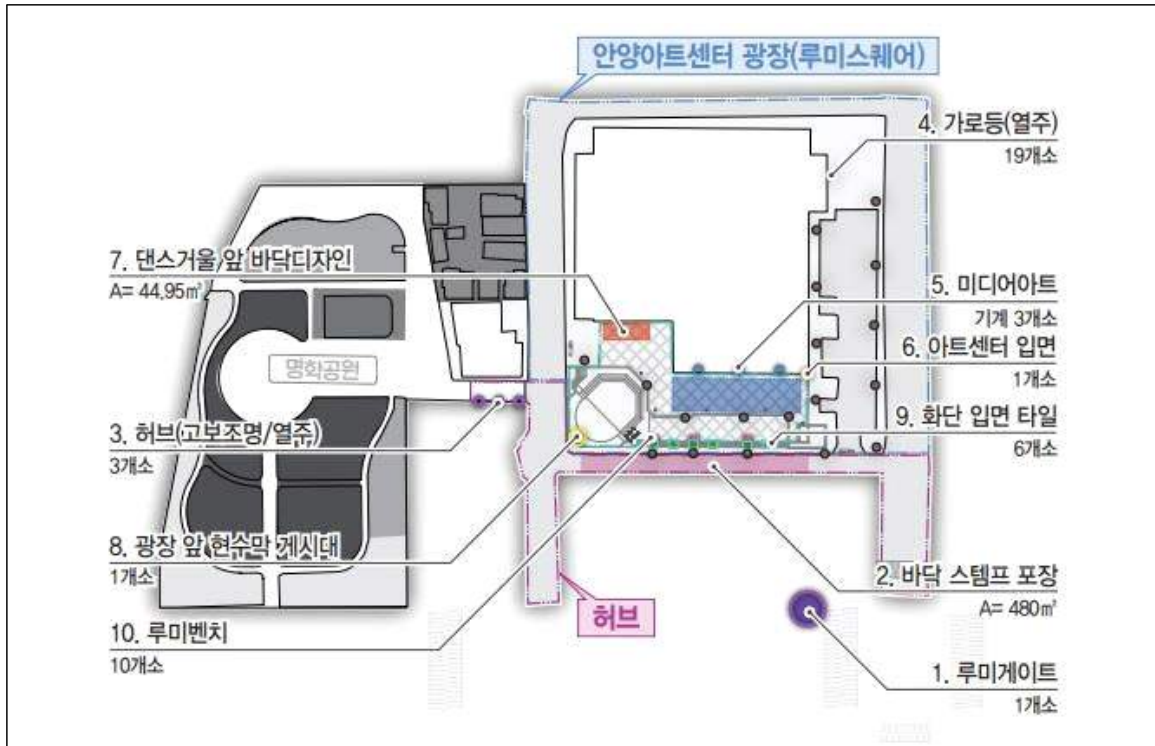

| 분류 | NO | 품목 | 개소 | 비고 |
|-----------------------------|----|--------------|------|------------------------|
| 허브 | 1 | 루미게이트 1 | 1개소 | - |
| | 2 | 바닥 스탬프 포장 | 1개소 | A= 480m ² |
| | 3 | 허브(고보조명/열주) | 3개소 | 열주 및 빔프로젝터 |
| 안양 아트센터 광장 (루미스퀘어) | 4 | 가로등(열주) | 19개소 | 교체(16개소) 및 신설(3개소) |
| | 5 | 미디어아트 | 1개소 | 등기구 3개소 |
| | 6 | 아트센터 입면 | 1개소 | 등기구 1개소 |
| | 7 | 댄스거울 앞 바닥디자인 | 1개소 | A= 44.95m ² |
| | 8 | 광장 앞 현수막 게시대 | 1개소 | - |
| | 9 | 화단 입면 타일 | 6개소 | 타일 부착 |
| | 10 | 루미벤치 | 10개소 | - |

디자인 시설 계획



아트센터 전경



사업 추진협의체 사전회의(2022.5.12.)



사업 추진협의체 보고회 개최(2022.7.06.)



중간보고회 개최(2022.9.01.)



주민설명회(2022.10.11.)



안양시 공공디자인진흥위원회(2022.11.04.)



사업 추진협의체 회의(2023.1.05.)




최종보고회(2023.1.27.)



영상콘텐츠 용역 착수보고회(2023. 5. 09.)



영상콘텐츠 용역 최종보고회(2023. 9. 15.)

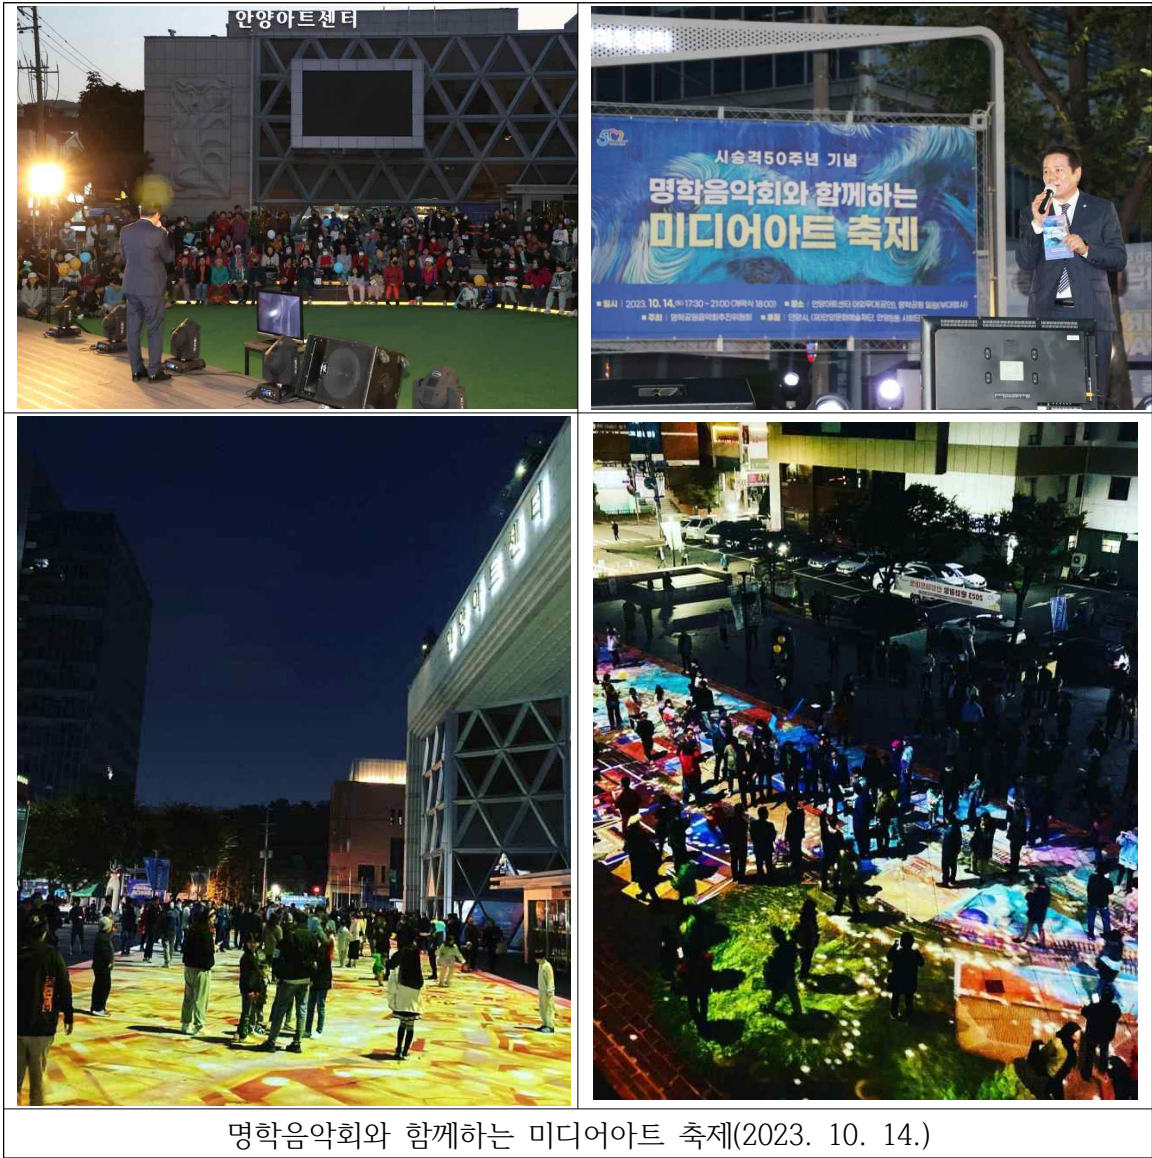

▶ 사업 추진 결과




미디어아트 설치 (전)



미디어아트 설치 (후)



입면 고보조명 (전)

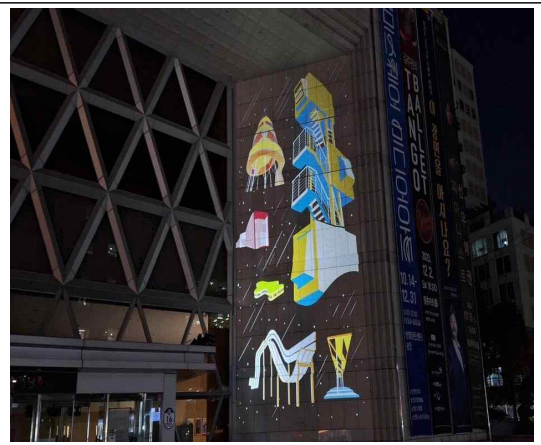


입면 고보조명 (후)



입간판, 현수막게시대 (전)




입간판, 현수막게시대 (후)



바닥 스텐실 포장 (전)




바닥 스텐실 포장 (후)

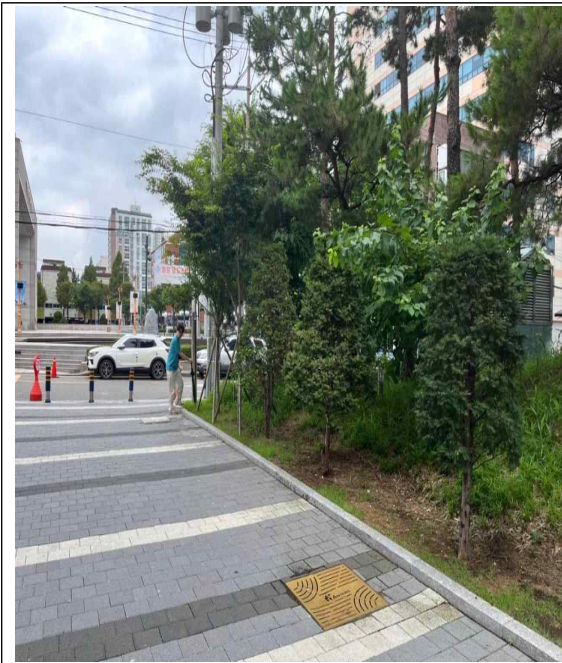

열주, 고보조명 설치 (전)




열주, 고보조명 설치 (후)

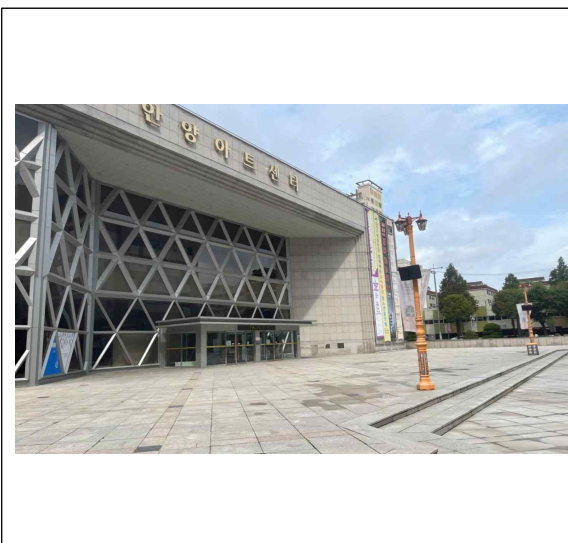


광장 가로등 설치 (전)




광장 가로등 설치 (후)

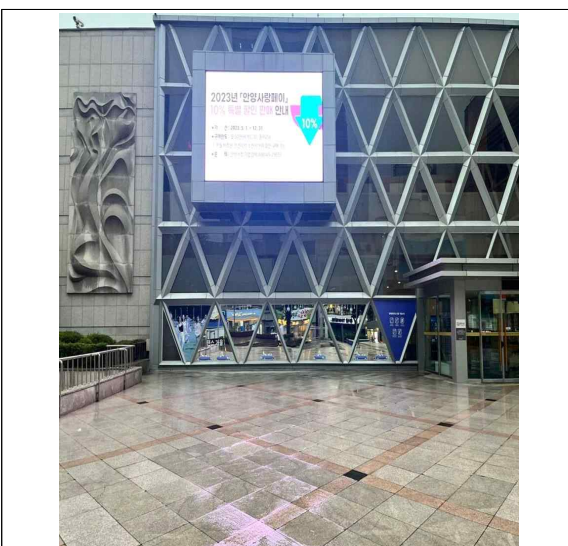

댄스거울 앞 바닥디자인 (전)

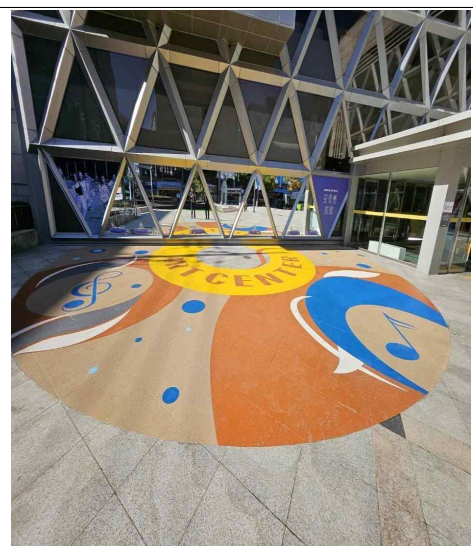


댄스거울 앞 바닥디자인 (후)

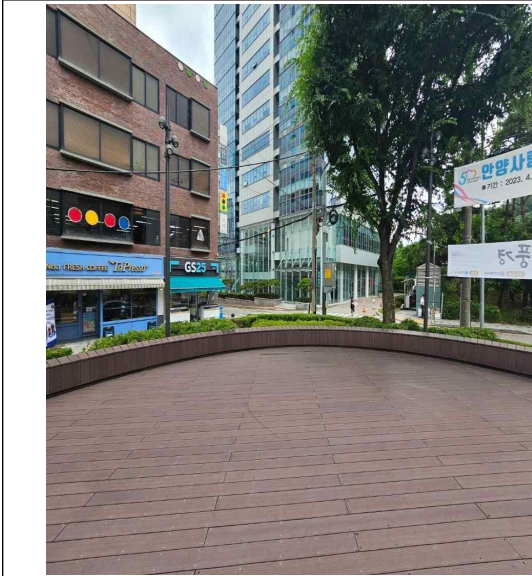


광장 앞 현수막게시대 (전)




광장 앞 현수막게시대 (후)

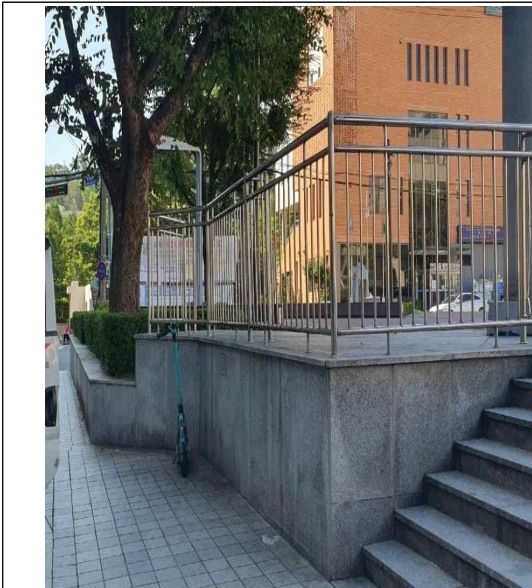

화단 입면타일 (전)

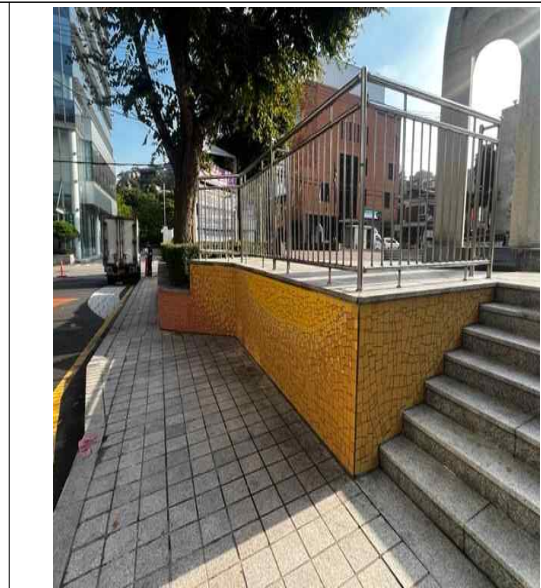

화단 입면타일 (후)

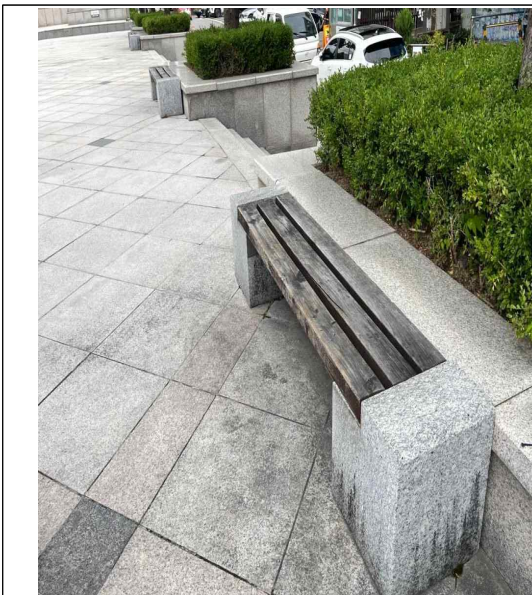

광장 벤치 교체 (전)



광장 벤치 교체 (후)

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 지역 주민들의 설문조사와 사업 추진협의체를 구성하여 주민의견 적극수렴
- 최근 트렌드에 따른 미디어아트 市 설치
- 만안지역 미디어아트 명소 조성 및 문화예술
- 안양아트센터 광장 상시 미디어아트 영상 상영 운영

【개선계획】

- 지역주민들의 지속적인 의견 수렴 및 지역작가 활용하여 영상 제작

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 입기후 |
|-----|-------|-------|-------|-------|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|
| | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | |
| 계 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | |
| 국 비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | |

【집행실적】

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 계 | 966 | 52 | 914 | | | |
| 국 비 | 966 | 52 | 914 | | | |

□ **시민소통 실적**

○ 시민소통 실적

(단위: 회)

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론·방송 보도 | SNS 소통 | 기타 시민참여 |
|------------|--------|----------|----------|--------|---------|
| 8 | - | 3 | 55 | 12 | 2 |

▶ 설명회, 공청회 등 (7회)

- 2022. 05. 12. : 사업 추진협의체 사전회의
- 2022. 07. 06. : 사업 추진협의체 보고회 개최
- 2022. 09. 01. : 중간보고회 개최
- 2022. 10. 11. : 주민설명회 개최
- 2022. 11. 04. : 안양시 공공디자인진흥위원회
- 2023. 01. 05. : 사업 추진협의체 회의
- 2023. 01. 27. : 최종보고회 개최

- 2023. 10. 14. : 명학음악회와 함께하는 미디어아트 축제 개최

▶ 민간전문가 자문 (3회)

- 2022. 06. 16. : 전문가 자문회의(1차)
- 2022. 06. 21. : 전문가 자문회의(2차)
- 2022. 08. 25. : 전문가 자문회의(3차)

▶ 언론·방송 보도 (3차례 55건)

① 2021. 12. 20.~21 : 13건 보도 (사업비 확보)

안양아트센터~명학공원 일원 문화예술거리 만든다 등
(전국매일신문, 머니S, 머니투데이, 경인일보, 경인방송,
기호일보, 중부일보, 아시아투데이, 일요신문, 내외경제tv,
브릿지경제, 파이낸셜뉴스, 신아일보)

② 2023. 1. 25.~30 : 20건 보도 (최종보고회 개최)

안양시 만안구 일원에 원도심 랜드마크 될 '문화예술거리' 조성한다
(파이낸셜뉴스, 뉴시스, 열린뉴스통신, 뉴스, 연합뉴스, 중부일보,
경기일보, 일요신문, 신아일보, 뉴스프리존, 머니S, 경인매일 등)

③ 2023. 10. 13. : 22건 보도 (사업 준공 및 미디어아트 축제 개최)

안양아트센터 광장 빛으로 물든다, 14일 미디어아트 축제 개최 등
(헤럴드경제, 연합뉴스, 스포츠서울, 브릿지경제 등)

▶ SNS 소통 (12건)

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| | |
| <p>최종보고회 SNS 소통(2023. 1. 19.)</p> | <p>보도자료 SNS 소통(2023. 1. 25.)</p> |



최종보고회 SNS 소통(2023. 1. 27.)



영상콘텐츠 용역 착수보고 SNS 소통 (2023. 5. 09.)



공장 감수 SNS 소통(2023. 8. 30.)




사업 추진현황 SNS 소통(2023. 9. 04.)




영상기기 설치상황 SNS 소통(2023. 9. 12.)




현장 리허설 SNS 소통(2023. 9. 13.)

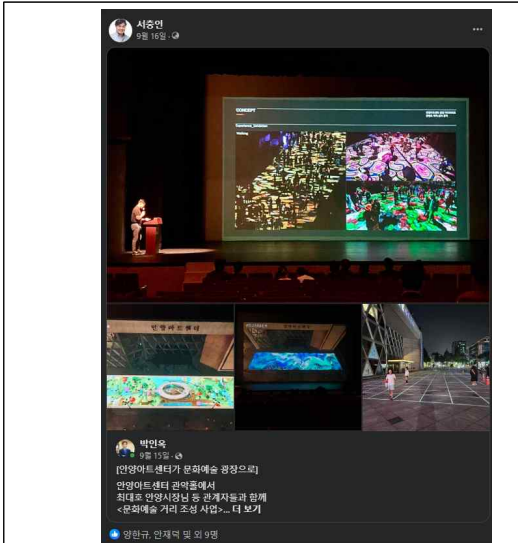


영상시사회 SNS 소통(2023. 9. 16.)

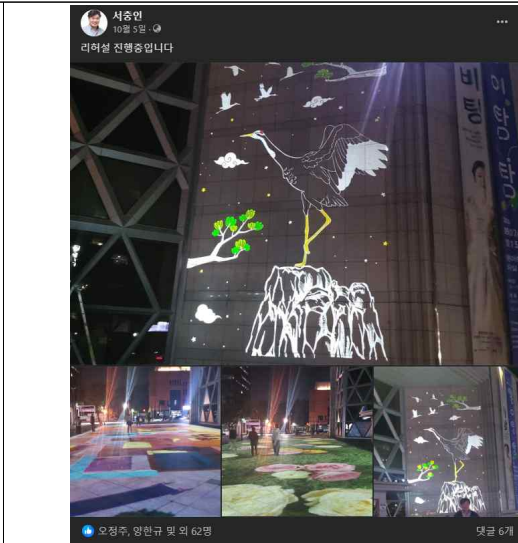

현장 리허설 SNS 소통(2023. 10. 05.)



미디어아트 축제 홍보 SNS 소통(2023. 10. 05.)

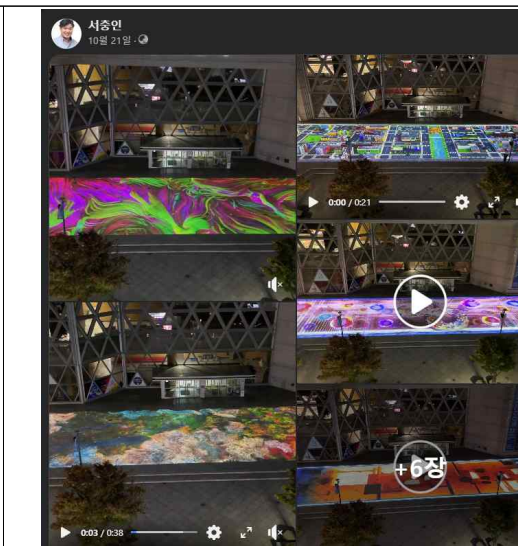

축제 개최 홍보 SNS 소통(2023. 10. 21.)

▶ 기타 시민참여 (2회)

- 2022. 06. 08. ~ 2022. 06. 09. : 전문가 설문조사 진행
- 2022. 06. 14. ~ 2022. 06. 20. : 일반인 설문조사 진행



사업 추진협의체 사전회의



민간전문가 자문회의(1차)



민간전문가 자문회의(2차)



민간전문가 자문회의(3차)



일반인 설문조사 진행



일반인 설문조사 진행
