

11-14

도서관 시설 확충(평촌도서관 건립 등)

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기후	예산			○				76%	2026년 9월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	동안구도서관장 도서관지원팀장 주무관	유옥환 김민자 신아영	☎6200 ☎6210 ☎6214	
필요(재정)			자체							

□ 최종목표


- 시설 노후 및 협소에 따른 시민 이용불편 해소 및 복합문화공간 조성
- 안양시 도서관을 대표하는 지역중앙관 역할 수행

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
평촌도서관 건립	<ul style="list-style-type: none"> · 지방재정중앙투자 2단계심사(5월~8월) · 조달청 설계적정성 및 설계경제성 등 검토(5월~8월) · 기본 및 실시설계 용역 완료(12월) · 건축허가(10월~12월) · 석면해체공사(12월) 	<ul style="list-style-type: none"> · 조달청 공사업체 선정(2월~4월) · 건물 철거공사(2월~4월) · 건립공사 착공(5월) 	<ul style="list-style-type: none"> · 건립공사 진행 	<ul style="list-style-type: none"> · 건립공사 준공(5월) · 개관 준비(6월 ~ 8월) · 재개관(9월)

□ 확인지표

- 평촌도서관 건립 절차 이행률

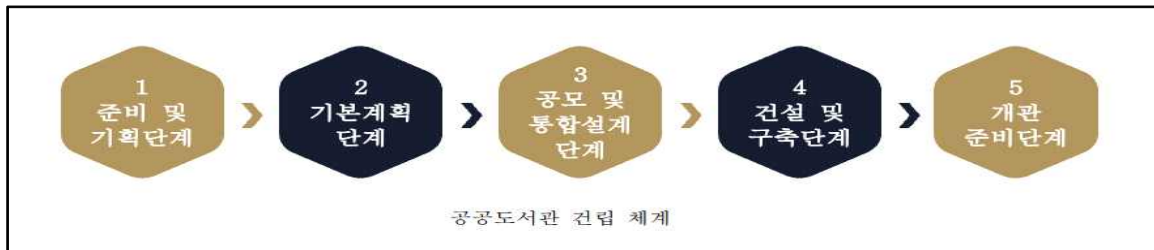

(※2022 공공도서관 건립·운영 매뉴얼 중 공공도서관 건립 체계 기준)

□ 사업개요

- 위치 : 현 부지(동안구 관양동 1589-5)
- 부지면적 : 9,900.3㎡

- 연 면 적 : 9,799.45㎡
 - 연 면 적 : 9,799.45㎡
 - 규 모 : 지하1층, 지상3층
 - 사업기간 : 2021. 3월 ~ 2026. 9월
 - 소요예산 : 39,860백만원(국비 4,500백만원, 시비 35,360백만원)
- (※개관준비금 5억원 포함)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본 및 실시설계																	
지방재정투자심사(2단계)																	
건립 공사																	
개관준비 및 재개관																	

□ 추진실적

- 평촌도서관 신축건립 기본계획 수립 2020. 4월
- 2020년도 안양시 제3차 공유재산심의 승인 2020. 9월
- 2020년 문화체육관광부 공공도서관 건립운영 컨설팅 실시 2020. 11월
- 행정안전부 지방재정중앙투자심사 통과(조건부) 2021. 3월
- 2021년 문화체육관광부 공공도서관 건립운영 컨설팅 실시 2021. 6월
- 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획) 결정(변경) 2021. 8월 ~ 12월
- 공공건축 사업계획 사전검토 2021. 9월 ~ 10월
- 도시관리계획(공원조성계획) 결정(변경) 2021. 12월 ~ 2022. 5월
- 현상설계공모 2022. 1월 ~ 5월
- 기본 및 실시설계 2022. 6월 ~ 2023. 6월
- 주민설명회 2022. 9월
- 총사업비 관리대상 사업 제외(국고 정액 지원 사업) 2022. 11월
- 주민간담회 2022. 12월
- 기본 및 실시설계 중간보고회 2022. 12월
- 2023년 1차 건축위원회 심의(통과) 2023. 1월
- 조달청 설계적정성 및 설계경제성 등 검토 2023. 5월 ~ 8월
- 행정안전부 지방재정중앙투자 2단계심사 통과 2023. 5월 ~ 8월
- 기술자문위원회 2023. 8월

- 소규모 재해영향성평가 용역 2023. 10월
- 건축허가(실시계획인가 포함) 2023. 11월 ~ 12월
- 석면해체공사 2023. 11월 ~ 12월
- 건물 철거공사 2024. 2월 ~ 4월
- 건립공사 착공 2024. 5월



□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 전통적인 도서관 개념을 탈피한 오픈스페이스 기반의 복합문화공간 조성
- 국내·외 우수도서관 벤치마킹을 통한 최신 도서관 건립 트렌드 적용

【미흡한 점】

- 건립재원 중 자체재원(시비) 부담비율이 높음[국비 45억(11%) / 시비 353.6억(89%)]

【개선계획】

- 총사업비 대비, 시비 부담비율을 줄이기 위한 추가재원 적극 확보

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	39,860	13,608	5,103	5,103	1,005	1,005	7,500	7,500	16,200	-	10,052	-	
국비	4,500	4,500	4,000	4,000	-	-	500	500	-	-	-	-	
시비	35,360	9,108	1,103	1,103	1,005	1,005	7,000	7,000	16,200	-	10,052	-	

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	4,690	1,608	1,110	1,972		
국비	4,000	1,608	1,099	1,293		
시비	690	-	11	679		

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

주민설명회	설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
3	1	2	1	-	-

- ▶ 2020. 11. 13. : 문화체육관광부 2020년 공공도서관 건립운영 컨설팅 실시
- ▶ 2021. 6. 22. : 문화체육관광부 2021년 공공도서관 건립운영 컨설팅 실시
- ▶ 2021. 10. 15. : 평촌도서관 건립 설문조사 실시
- ▶ 2022. 9. 16. : SK브로드밴드 Btv 뉴스
「30년된 평촌도서관, 열린공간으로 재건축」
- ▶ 2022. 9. 16. : 기본 및 실시설계 주민설명회 개최
- ▶ 2022. 12. 6. : 주민간담회 개최
- ▶ 2024. 8. 28. : 현장설명회 개최

	<p style="text-align: center;">- 평촌도서관 건립(신축) 관련 - 설문조사 참여 안내</p> <p>안양시에서는 존공 후 20여년이 경과한 평촌도서관 건립(신축)을 계획하고 있습니다. 시민 여러분의 의견을 수렴하여 반영하고자 하오니 많은 관심과 참여 부탁드립니다.</p> <p>실시간 2021. 10. 15.(금) ~ 10. 21.(목) (7일간)</p> <p>실문대상 도서관 이용시민</p> <p>참여방법 온 라 인 : 이메일 QR코드 접속 오프라인 : 설문지 작성</p> <p>문 의 평촌도서관 (☎ 031-8045-6214)</p> <p>※ 참여자 중 30명 추천하여 도방일 편의점 상용권(5천원) 제공 (당라인 참여 및 개인정보제공 동의에 한함)</p> <p style="text-align: center;">온라인 설문 참여 QR코드</p> 
<p>문화체육관광부 공공도서관 건립 운영 컨설팅</p>	<p>평촌도서관 건립 설문조사</p>
 <p style="text-align: center;">30년된 평촌도서관, 열린공간으로 재건축</p>	
<p style="text-align: center;">방송 보도</p>	<p style="text-align: center;">주민설명회 및 주민간담회</p>

○ 시민소통 계획

- ▶ 향후 안양시 SNS를 활용한 건립 관련 홍보 실시

□ 향후 추진계획

- 건립공사 준공 2026. 5월
- 개관 준비 2026. 6월 ~ 8월
- 평촌도서관 재개관 2026. 9월
