

15-3

## 종합운동장 스포츠 테마파크 조성

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기후	예산			○				2%	2028년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	신성장전략과장	이장우	☎5300	
필요 (재정)			자체				신성장전략팀장	표순보	☎2341	
							주무관	김민수	☎5446	

### □ 최종목표

종합운동장 부지에 새로운 개념의 스포츠 시설 및 플랫폼을 구축하여 종합적인 스포츠 여가활동을 위한 테마파크 조성

### □ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
종합운동장 스포츠 테마파크조성	기본구상 및 타당성조사용역 실시	기본구상 및 타당성조사용역 완료	도시공사 출자를 위한 타당성조사	도시공사 업무협약	도시공사 사업시행

### □ 확인지표

- 종합운동장 종합스포츠 테마파크 조성

### □ 사업개요


- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12.
- 위치 : 동안구 평촌대로 389일원 (종합운동장 부지)
- 사업내용(안)
  - ▶ 스포츠컴플렉스 : 실내외 스포츠 시설(수영장, 농구장 등 종합스포츠 공간)
  - ▶ 기타시설 : 체육회관 등

### □ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
타당성조사 용역																	
도시공사 출자 타당성 검토																	
도시공사 업무협약																	
도시공사 사업시행																	

□ **추진실적 및 계획**

- 2023. 5. 4.: 기본구상 등 용역비 제2회 추경예산 편성
- 2023. 9. 5.: 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수
- 2023. 9. 26.: 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수보고회 개최
- 2024. 3. ~ 5.: 복합개발 관련 전문가 자문 및 사례조사
- 2024. 5. 24.: 용역 중지(개발 방향 재수립 여부 검토 필요)
- 2024. 7. 25.: FC축구전용경기장 건립 사업 관련 간담회 개최
- 현재: 축구전용경기장 건립 관련 재정부담 완화 대책이 필요하다는 시의회 의견 및 전문가 간담회 결과에 따라 사업계획 변경 및 관련사항 검토 중(2024년 2회 추경 관련 예산 편성)

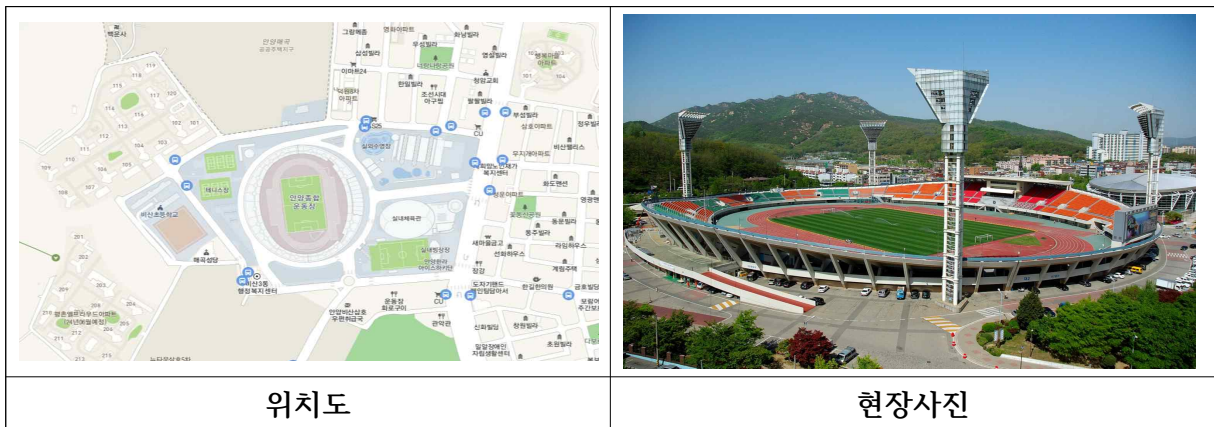

□ **자체 점검결과**

- FC축구전용경기장 건립 관련 사업비 조달 및 재정부담 완화 대책이 필요하다는 시의회 의견 및 관련 전문가 간담회 결과에 따라 관련 검토를 위한 신규 용역 추진 필요(관련 예산 반영 및 발주 추진 중)

□ **연차별 투자계획 및 집행**

- 신규 용역 발주를 통해 사업화 방안 등 검토 필요(사업계획 변경)

□ **향후 추진계획**

- 2024. 10월 초: 신규 용역 발주
  - 안양 공공복합체육시설 건립 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역
- 2024년 말: 신규 용역 착수 및 관련 검토 추진
