

15-5

[유소년] 야구 전용 경기장 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산			○				25%	2025년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	체육과장 체육시설팀장 주무관	송기찬 이인수 유가혜	☎5910 ☎2146 ☎5082	
필요 (재정)			자체							

 최종목표

유소년 전용 야구경기장을 건립하여 주민 생활체육 활성화에 기여

 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
야구전용 경기장 건립	사업방향 확정 및 예산확보	GB행위 신청 및 설계 용역 추진	공사착공·준공	-	-

 확인지표

○ 야구 경기장 건립

 사업개요


- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사업위치 : 경인교육대학교 내부 부지 1개소
- 소요예산 : 3,000백만원
- 사업내용 : 야구장 및 풋살장 조성 등

 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
예산확보 및 투자심사																	
GB행위신청 및 설계용역																	
공사착공, 준공																	

□ 추진실적

- 2022. 11. 22. : 야구장 및 체육시설물 건립제안
- 2023. 3. 10. : 1차 실무회의(도시계획과)
- 2023. 3. 21. : 시장 면담(경인교육대학교 총장 접견)
- 2023. 4. 26. : 2차 실무회의(체육과)
- 2023. 6. 15. : 업무협약 관련 의회 보고
- 2023. 7. 27. : MOU(양해각서) 체결
- 2023. 10. 13. : 건강체육시설 건립사업 도비 교부(4억원)
- 2023. 10. 28. : 경기도 지방재정투자심사 통과(조건부)
- 2023. 12. 21. : 2024년도 본예산 편성(10억원)
- 2024. 3. 25. : 설계용역 착수
- 2024. 3. 25. : 설계용역 착수
- 2024. 6. 25. : 경인교대 업무협약[※배치계획 등 설계(안)]
- 2024. 7. 22. : 설계용역 완료
- 2024. 7. 31. : 2024년도 특별교부세 교부결정(※ 5억원)
- 2024. 9. 11. : 도시계획위원회 심의(조건부 통과)

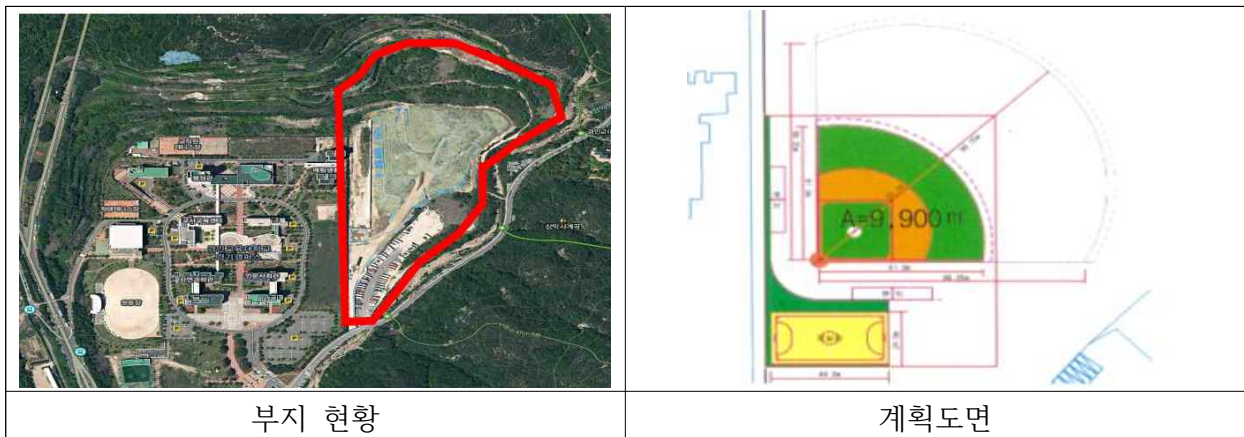

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 2023. 7. 27. : 안양시 · 경인교대 mou체결
- 2023. 10. 13. : 건강체육시설 지원사업 선정(도비 4억원)
- 2024. 7. 31일 특별교부세 교부결정(국비 5억원)

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	3,000	1,900	-	-	400	400	2,600	1,500	-	-	-	-	-
국비	500	500	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-
도비	1,500	400	-	-	400	400	1,100	-	-	-	-	-	-
시비	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	73	-	-	73	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	73	-	-	73	-	-

□ 향후계획

- 2024. 10. . : 개발행위허가
- 2024. 12. . : 공사 착공
- 2025. 12. . : 공사 준공
