

15-9

보은어린이공원(관양1동) 아이누리 놀이터 정비

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2022년 10월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	공원관리과장		백시원	☎5090	
해당없음			자체			동안공원팀장		정기철	☎2412	
					주무관		이선아	☎5022		

□ 최종목표

규격화되고 표준화된 획일적 놀이시설 중심의 어린이공원에서 벗어나 어린이들에게 창의적인 놀이공간과 시민에게 편리하고 쾌적한 휴식 공간 제공

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
공사 후 지속관리	1개소	1개소	1개소	1개소

□ 확인지표

- 보은어린이공원 1개소 정비 완료

□ 사업개요

- 위치: 동안구 관양1동 1439-6
- 면적: 1,699㎡
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2022. 10.
- 사업비: 200백만원
- 사업내용
 - ▶ 미끄럼틀 등 5종 8점 놀이시설 설치
 - ▶ 탄성포장 394㎡
 - ▶ 주민편의시설 (등의자 및 야외운동기구) 설치

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공사 착공 및 준공																	
완료 후 지속 관리																	

□ 추진실적

- 2022. 1. 25. : 실시설계용역 착수
- 2022. 3. 23. : 주민의견청취
- 2022. 4. 8. : 경기아이누리 자문단 서면 자문
- 2022. 6. 10. : 일상감사 완료 및 실시계획인가 관련부서 협의
- 2022. 6. 16. : 공사발주
- 2022. 7. 5. : 공사착공
- 2022. 10. 21. : 공사준공



□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 주민의견 수렴 및 경기도 자문위원단 자문을 통해 세부사업 추진
- 획일적인 놀이시설 대신 다양한 높낮이의 마운딩을 활용한 놀이시설 배치로 어린이들에게 창의적인 놀이공간 제공

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	200	200	200	200									
도 비	100	100	100	100									
시 비	100	100	100	100									

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	200	200				
도 비	100	100				
시 비	100	100				


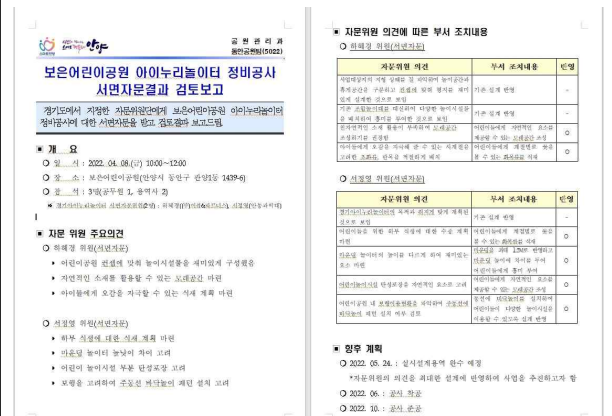
□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
1	-	1	17	-	-

- ▶ 2022. 2. 10. : 공원정비 계획 보도 (뉴시스 등 10개 지역언론)
- ▶ 2022. 3. 23. : 주민의견 청취
- ▶ 2022. 4. 8. : 경기아이누리놀이터 전문위원단 자문
- ▶ 2022. 10. 19. : 공원정비 완료 보도 (중부일보 등 7개 지역언론)

	
<p>주민의견청취</p>	<p>자문위원회 결과보고</p>

□ 향후 추진계획

○ 공원 지속 유지관리
