

4-12

안양남초교 후문길 차없는거리 조성공사

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2022년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	도로과장	이희석	☎2430	
해당없음			자체				보행환경팀장	오택수	☎5095	
							주무관	장혜원	☎5096	

□ 최종목표

차 없는 거리, 걷고 싶은 길을 새롭게 조성하여 보행자의 안전을 확보하고 지역주민에게 소통과 휴식 공간을 제공하고자 함

□ 확인지표

- 안양남초교 후문길 차없는거리 조성공사 완료

□ 사업개요


- 사업기간: 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치: 호계동 1209번지 일원 (우방@ 502동~안양남초교 후문~임광@ 308동)
- 사업비: 788백만원
- 사업내용: 차없는거리 조성 L=210m, B=10m
 - ▶ 디자인 블록 포장 1식
 - ▶ 조경 식재 및 휴게시설물 설치 1식 등

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
착공 및 준공																	

□ 추진실적

- 2021. 8. 18.: 교통안전시설 심의위원회 심의 의결
- 2022. 2. 7.: 실시설계 용역 착수
- 2022. 3. 17.: 주민간담회(1차)
- 2022. 3. 31.: 주민간담회(2차)
- 2022. 5. 4.: 공공디자인 심의
- 2022. 6. 6.: 실시설계 용역 완수
- 2022. 8. 8.: 공사 착공
- 2022. 12. 27.: 공사 준공

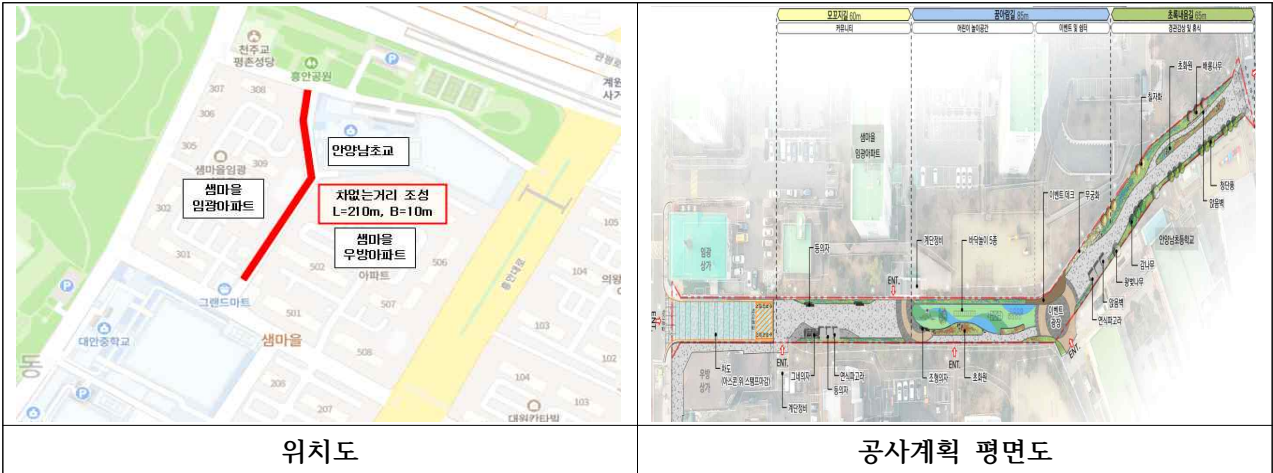

자체 점검결과

- 해당 사업은 주민간담회 개최를 통해 지역주민 및 안양남초교 학생들의 의견 청취·수렴하여 추진하였으며, 안양남초교 차 없는 거리 조성으로 안전한 통학로를 제공하고 주민들의 화합과 커뮤니티 공간으로 활용되고 있음.

연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
시 비	850	850	850	850									

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
시 비	778	778				

시민소통 실적

- 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
2	-	-	1	-	-

▶ 2022. 3. 17. ~ 3. 31.: 주민간담회 2회 개최

